

日光東京線街路改良工事(本町ロータリー交差点)

工事説明会


令和5年3月10日・12日

埼玉県さいたま県土整備事務所
中原建設株式会社

本日の流れ

- 街路事業の概要について
- 事業全体のスケジュール
- 歩道橋下部工事の流れについて

整備区間

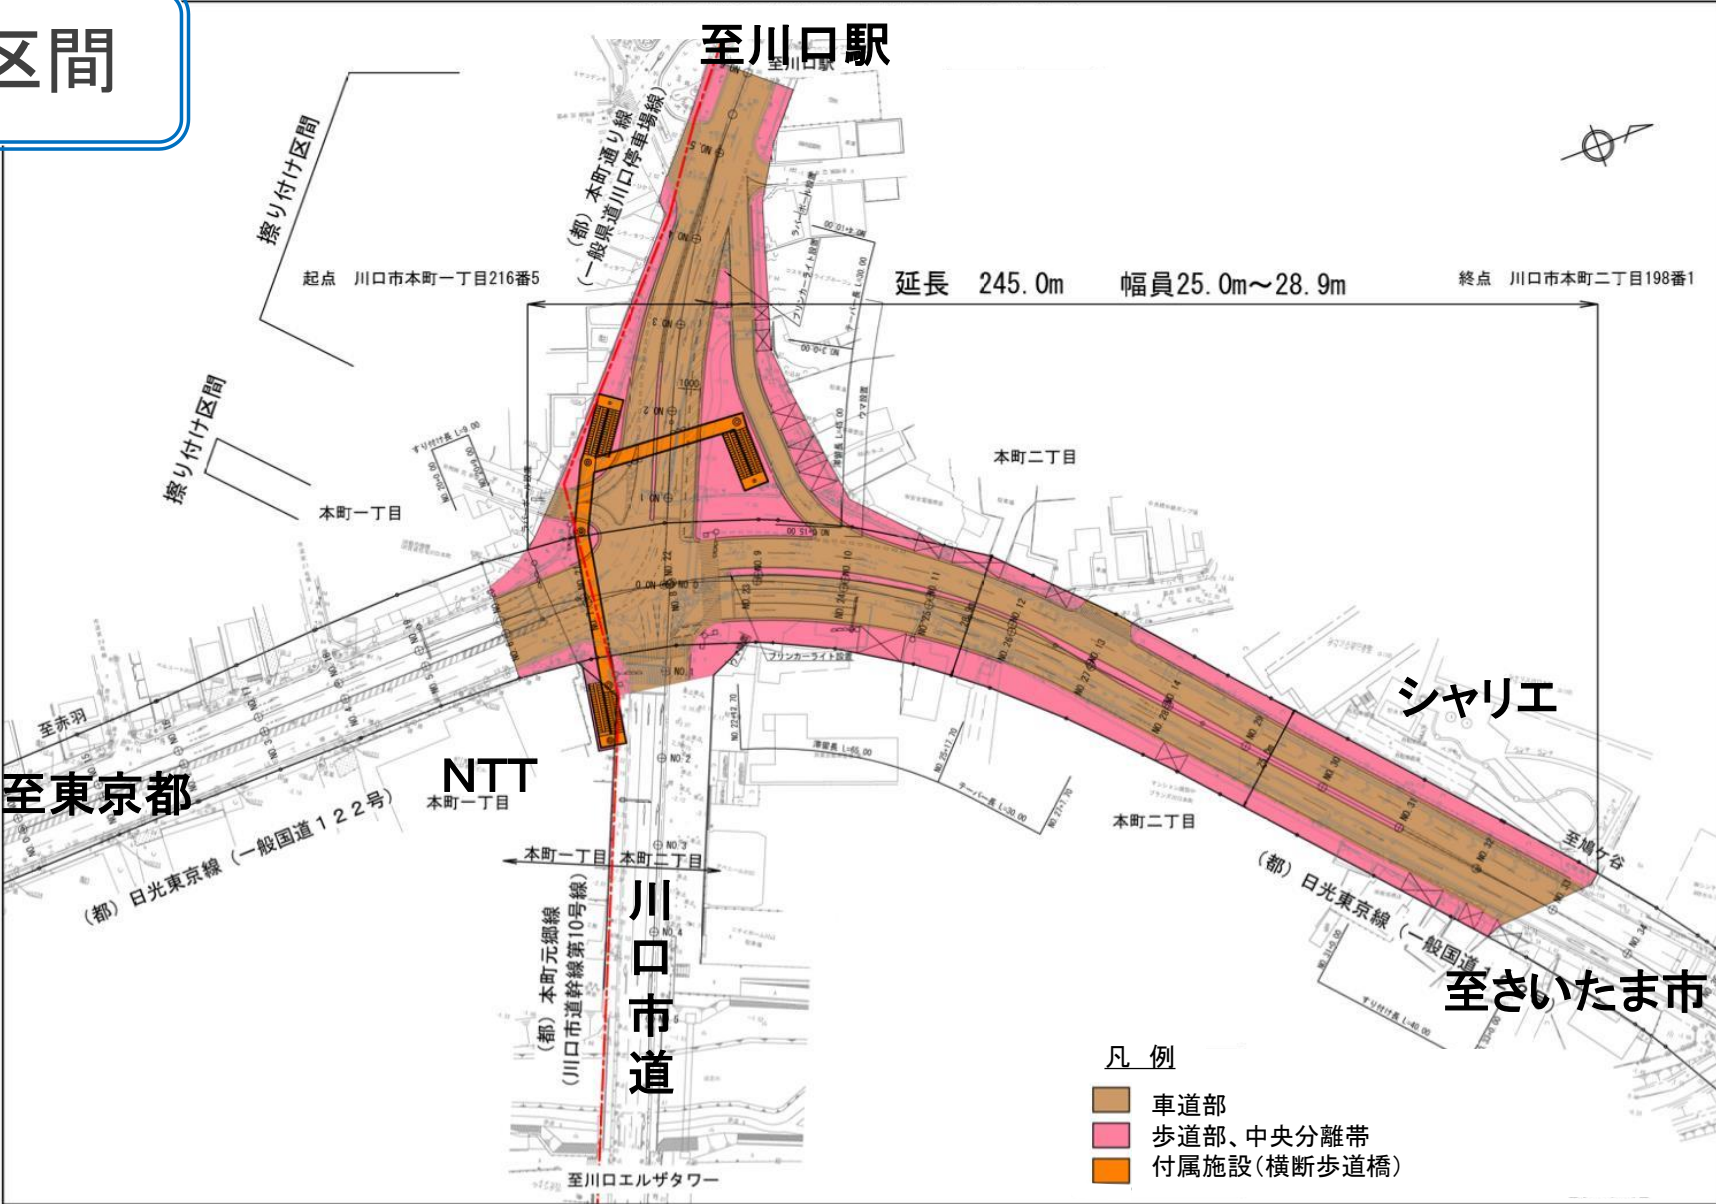

整備進捗状況

【経緯】









平成 8年	都市計画の変更(道路幅25m)＝現在の計画
平成30年 4月	事業認可を取得、事業開始
平成30年10月	事業説明会
平成30年度～	用地買収、調査、設計等

【現状】

- ・用地買収率: 63%(面積ベース)
- ・工事進捗率: 0%




事業全体のスケジュール

工事スケジュール

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
歩道橋下部工 (基礎杭等)						
						
						
歩道橋上部工 (橋脚、桁)						
支障物件移設 (水道、下水、ガス等)						
電線地中化工						
舗装工						
用地買収						

歩道橋が使用できない期間

整備計画図

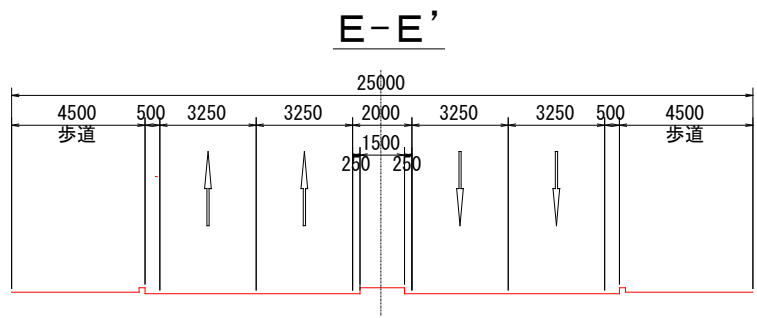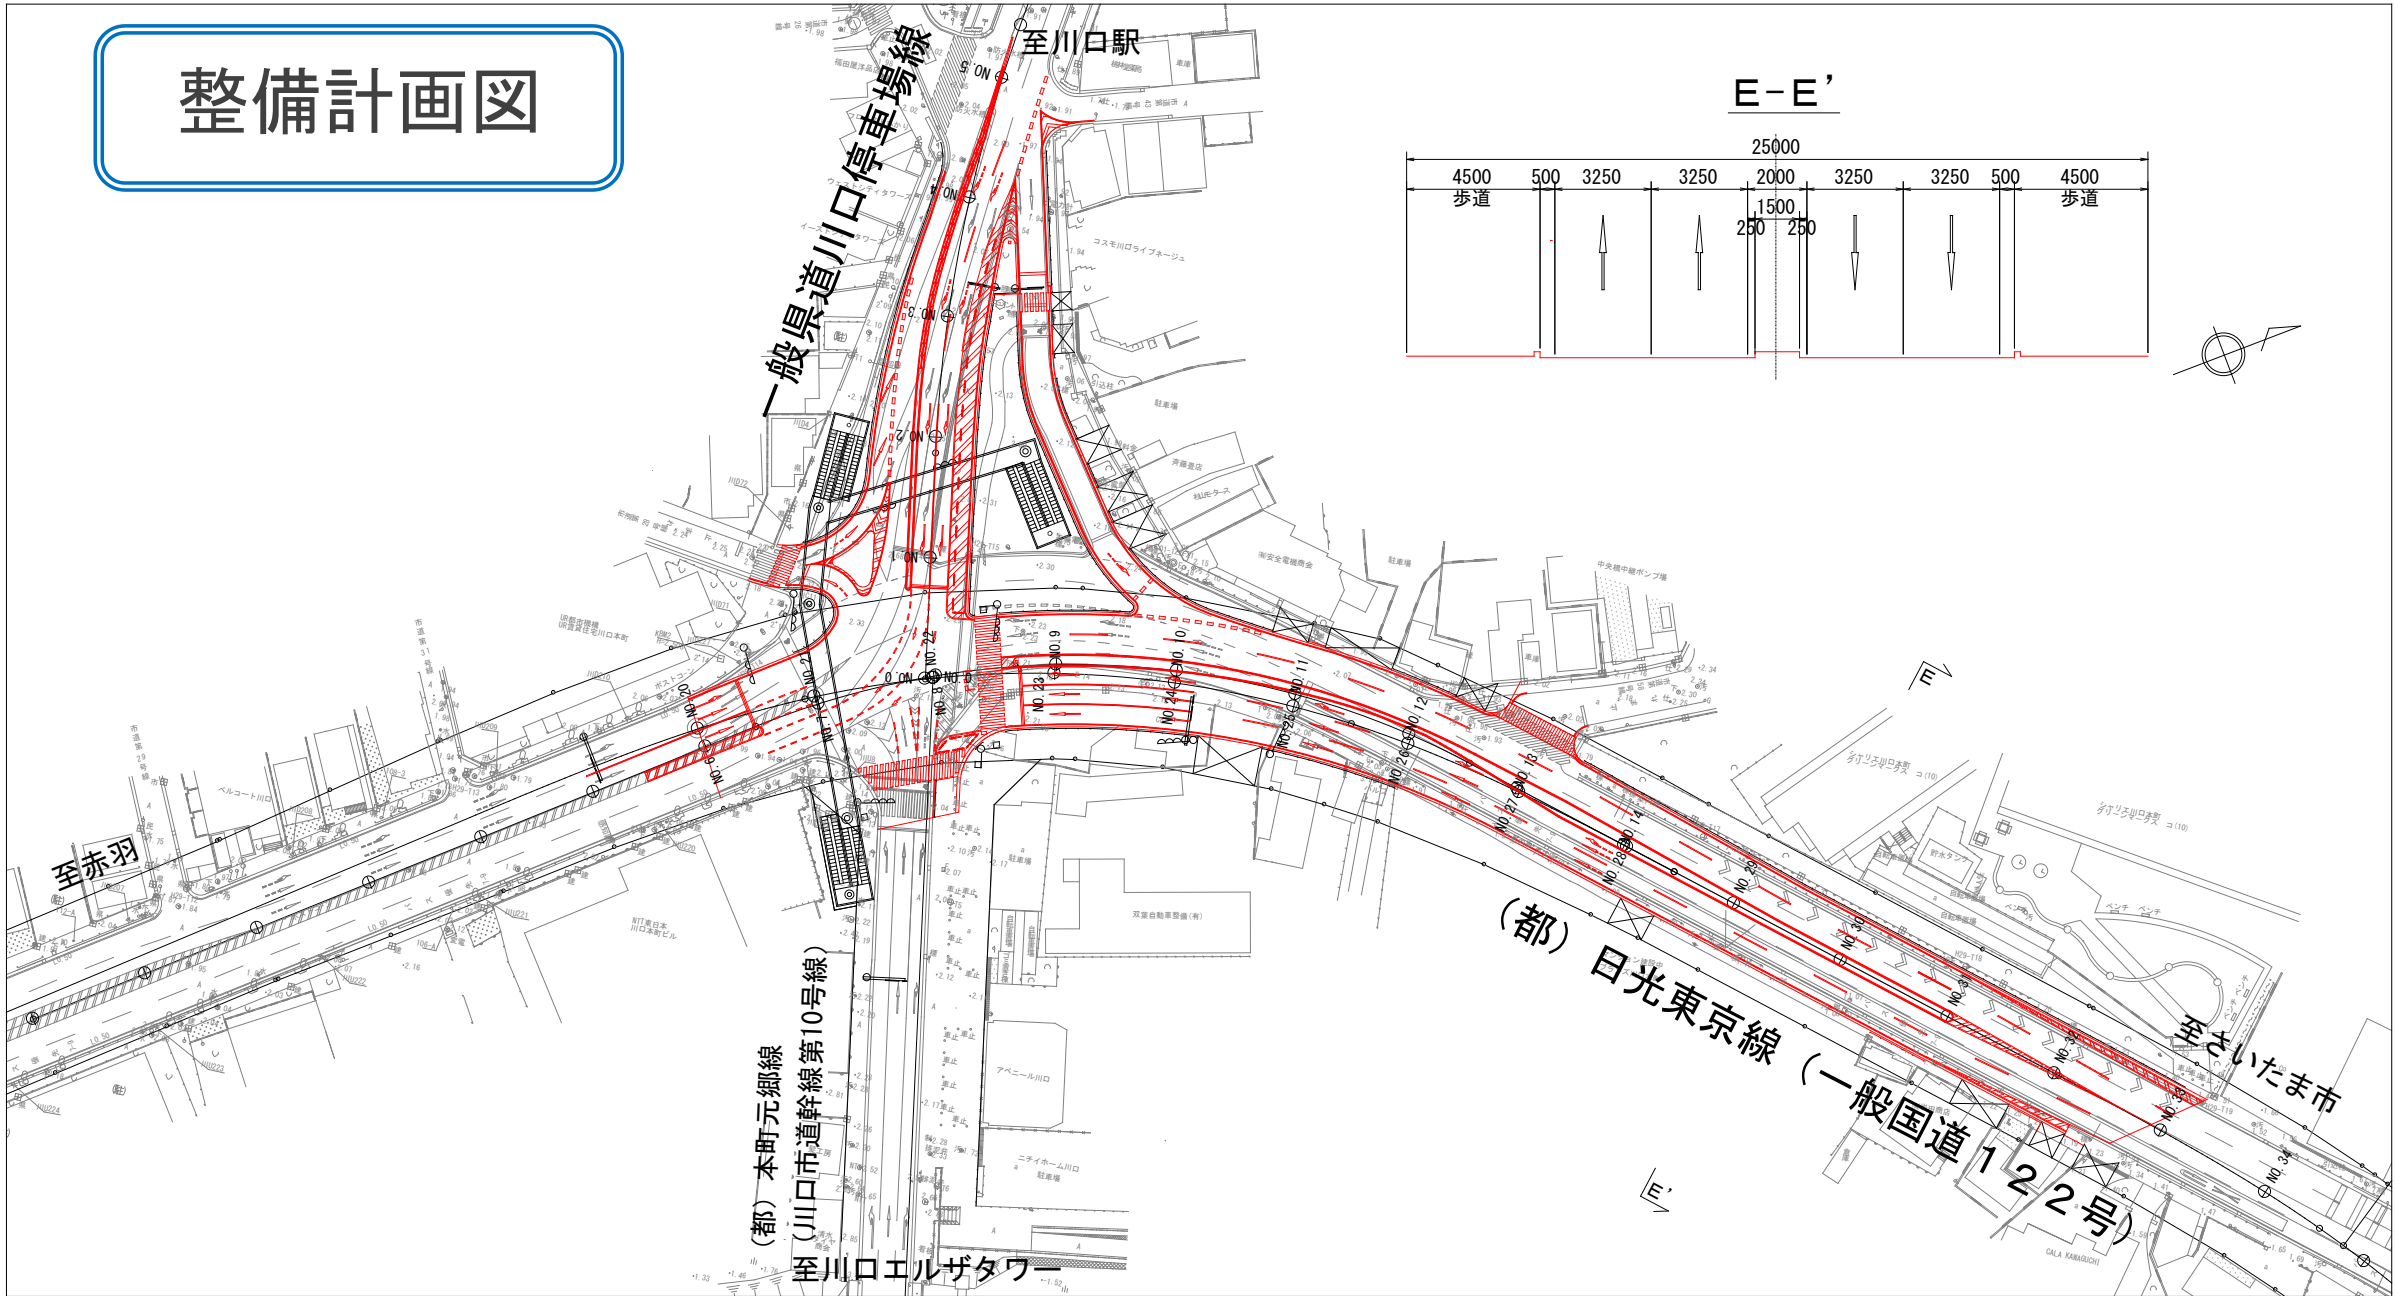

歩道橋下部工事の流れについて


歩道橋架替え工事

現況

歩道橋
撤去時

新設歩道橋
設置

歩道橋現況図

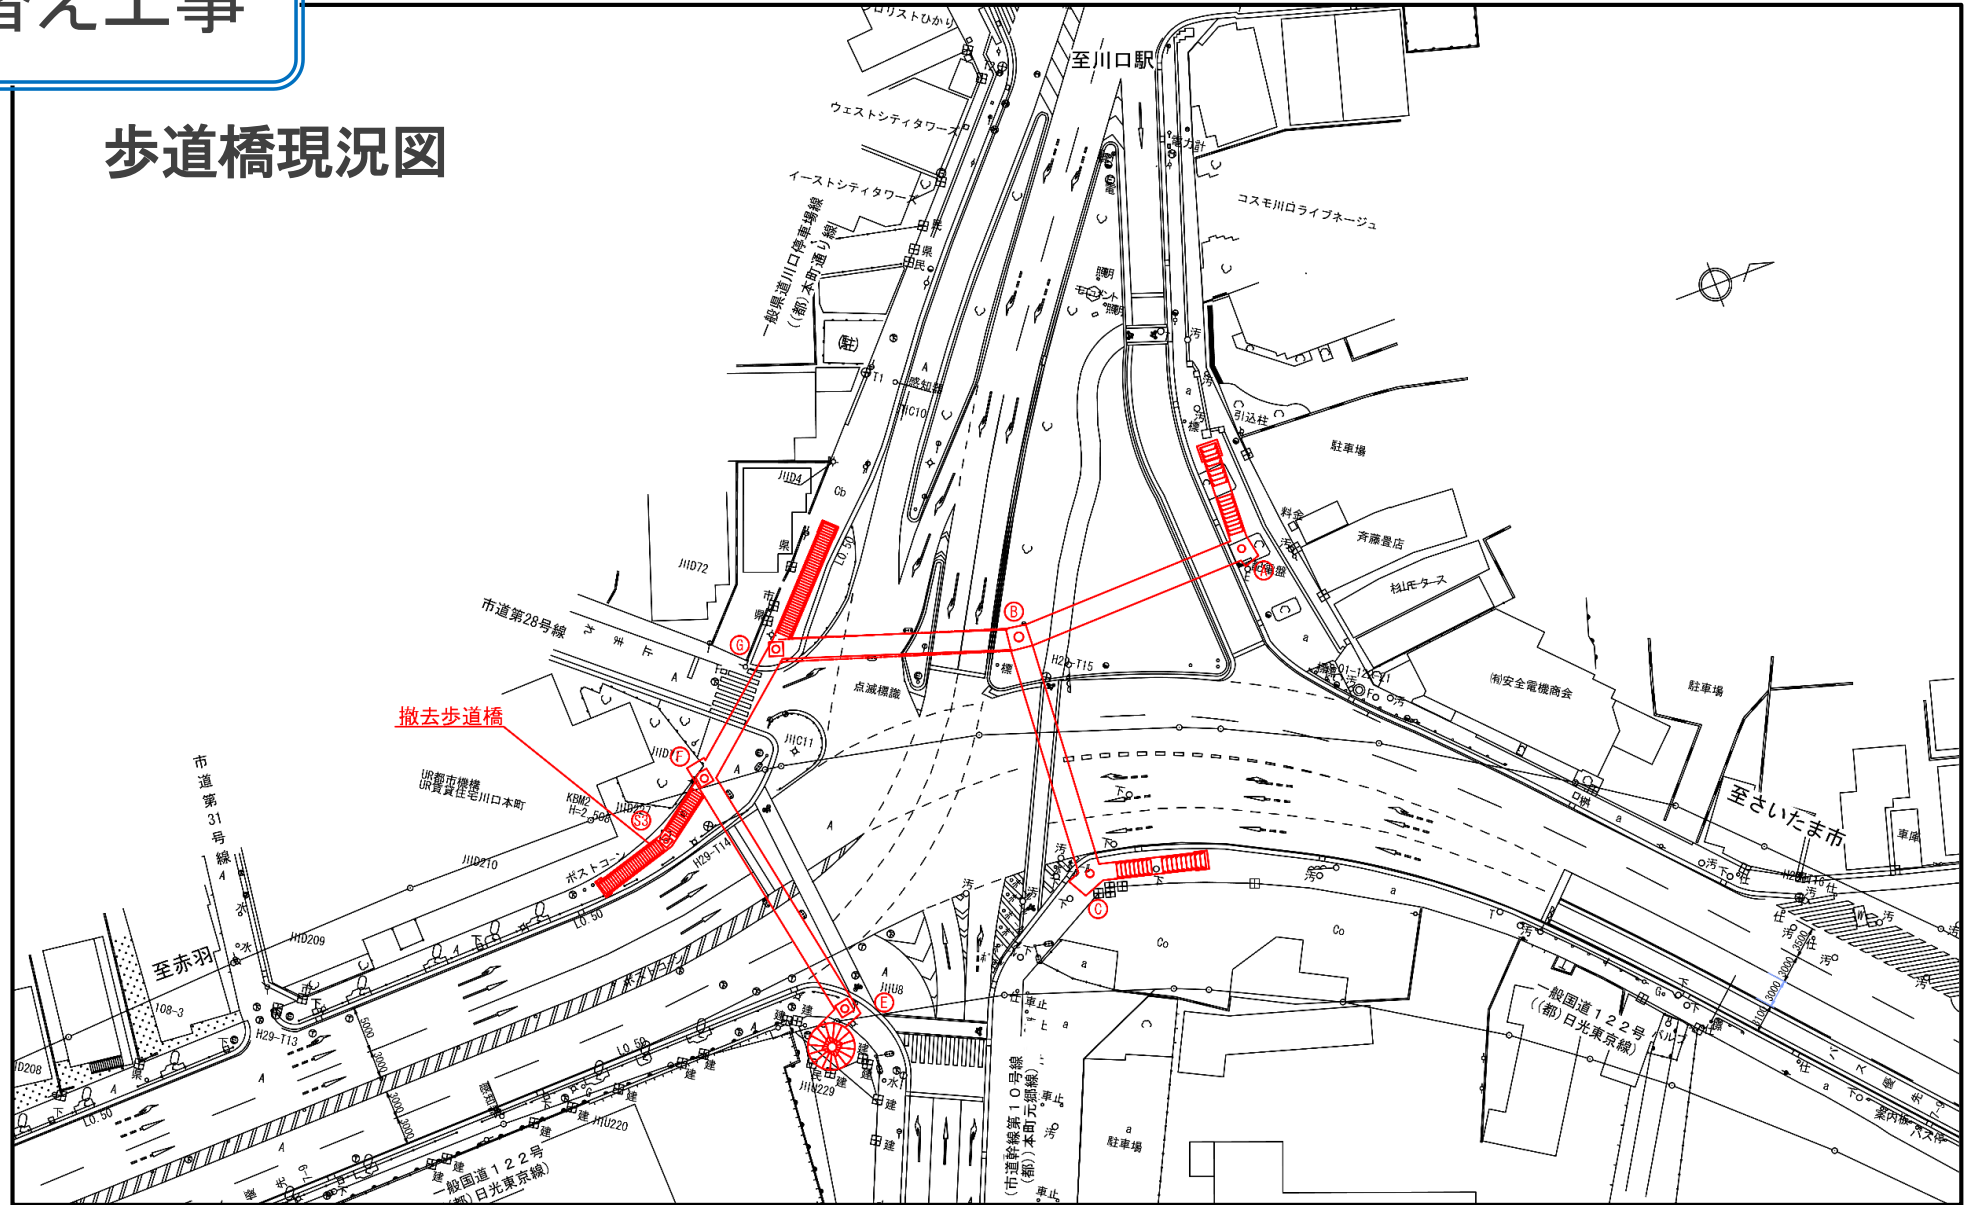

歩道橋架替え工事

現況




歩道橋
撤去時



新設歩道橋
設置

歩道橋撤去時

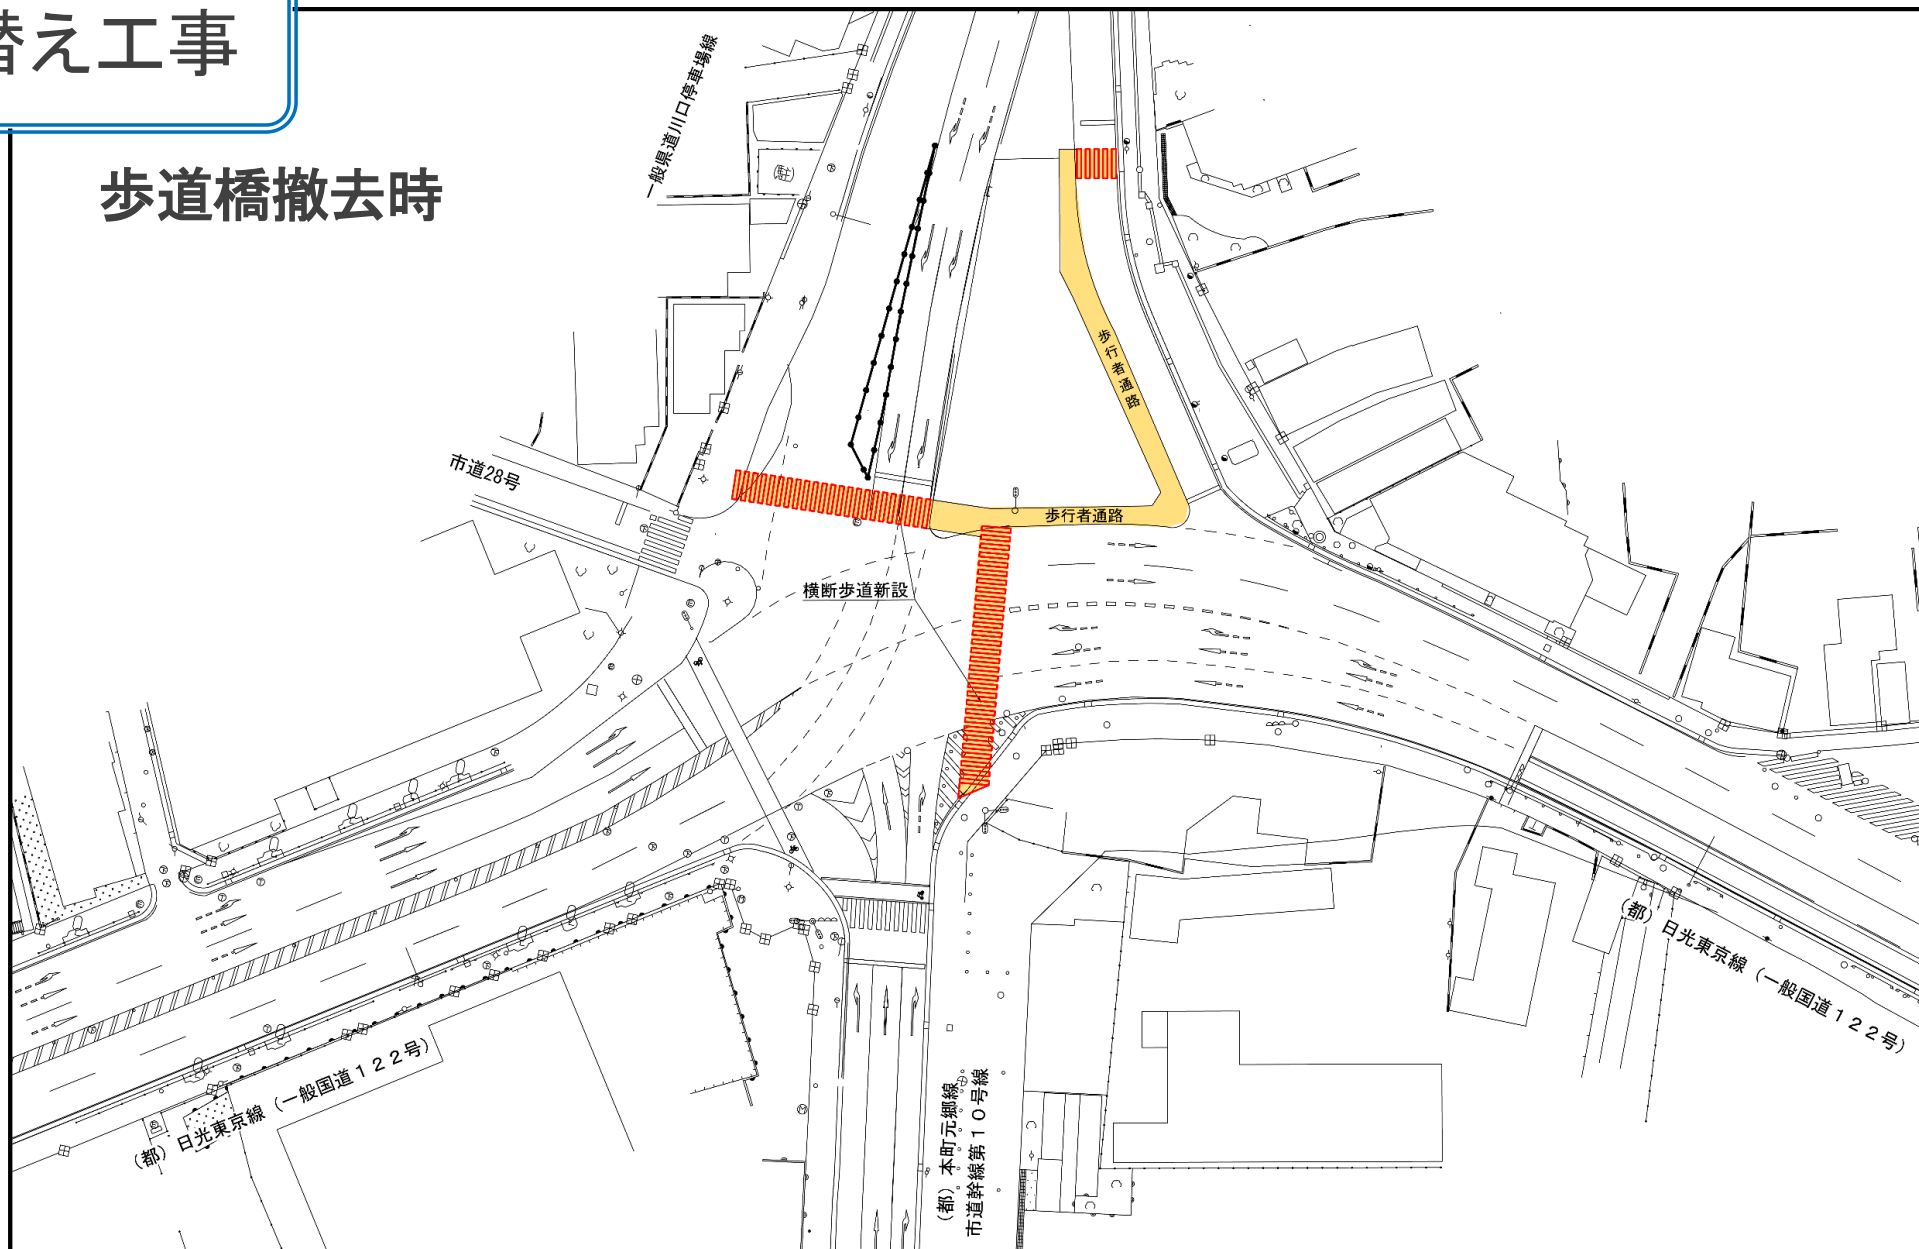

歩道橋架替え工事

現況




歩道橋
撤去時



新設歩道橋
設置

新設歩道橋設置図

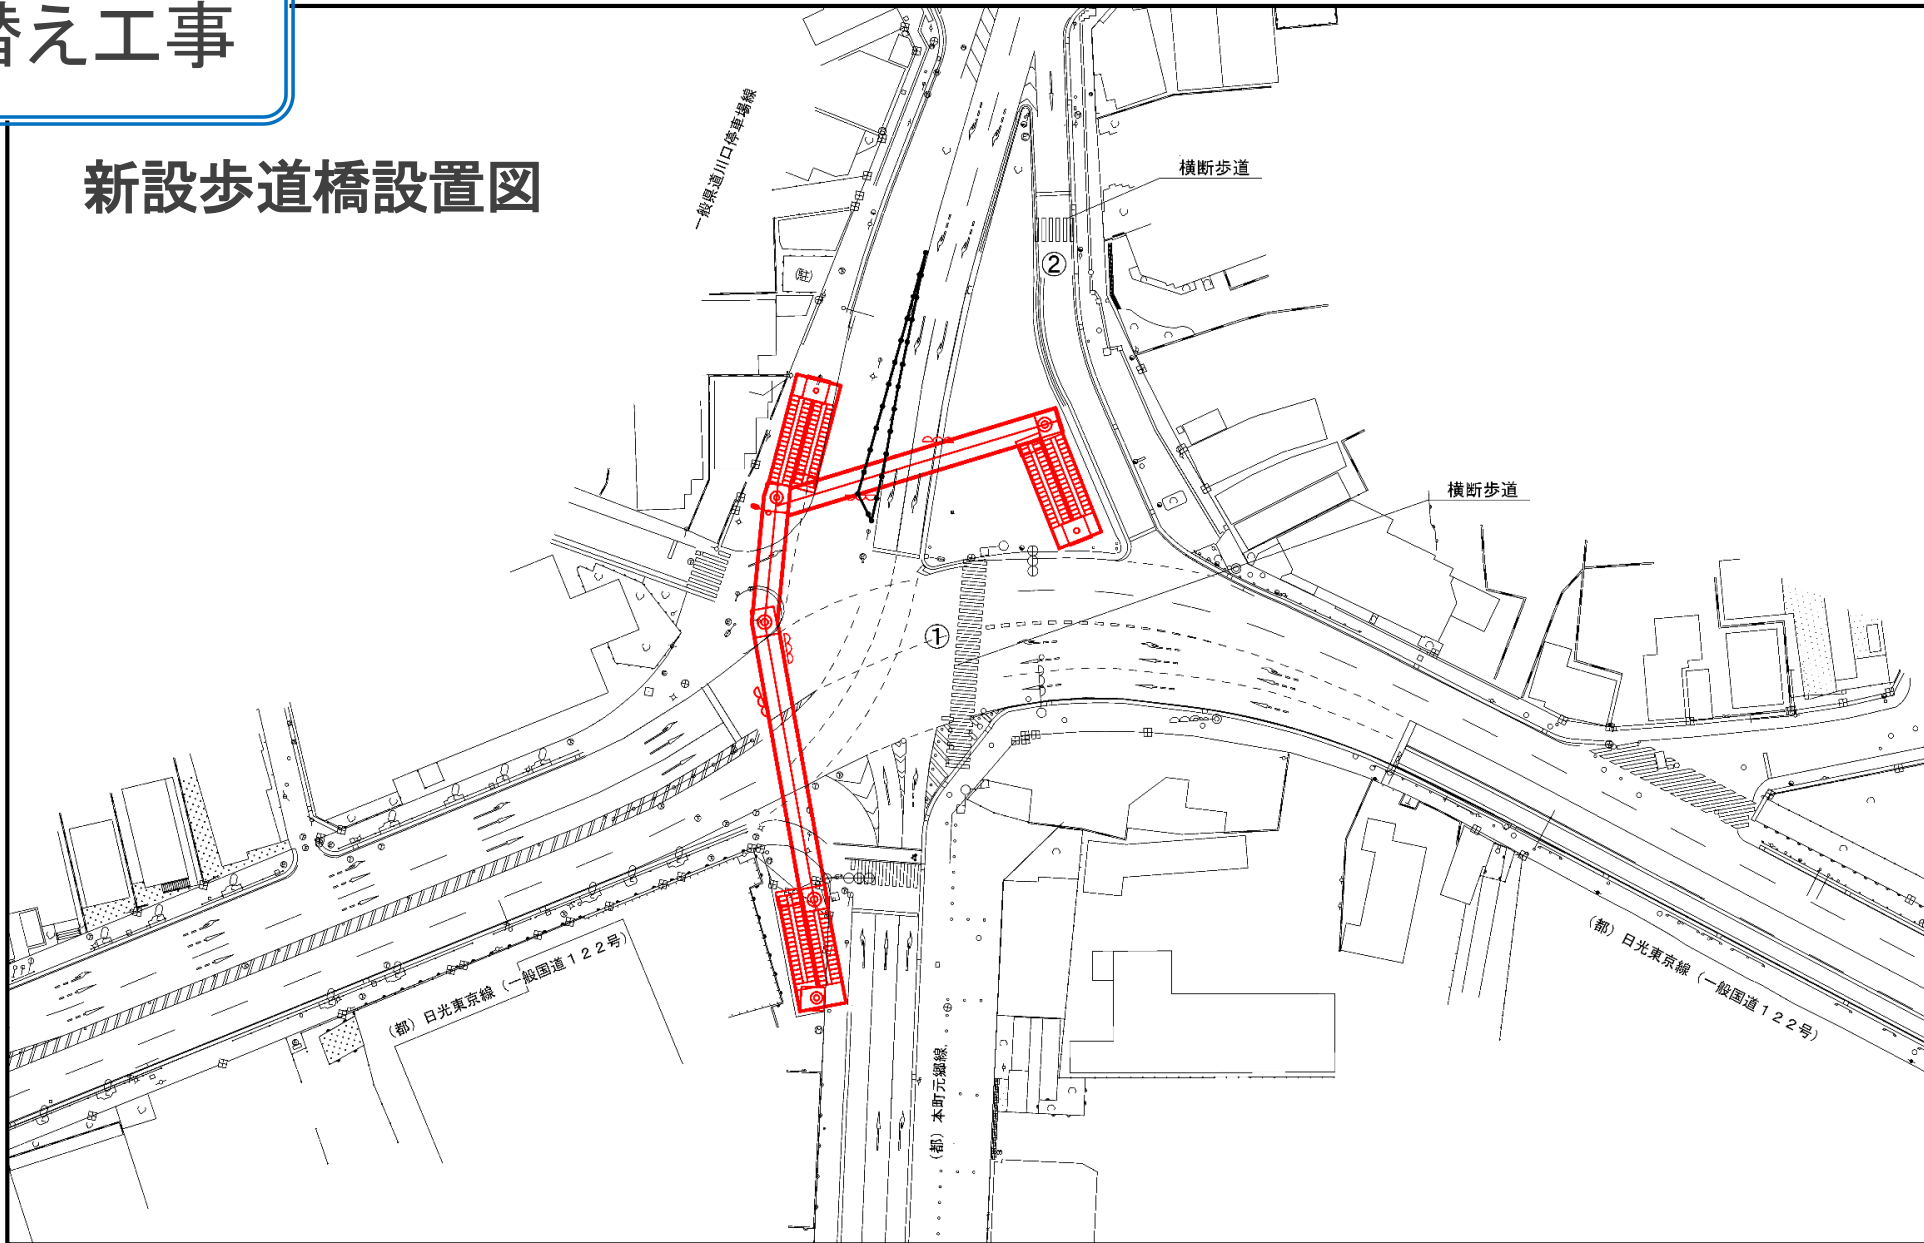

歩道橋架替え工事

新設歩道橋 完成イメージ図

現況



歩道橋
撤去時



新設歩道橋
設置



工事内容

交通島撤去工 等


新設歩道橋
下部工①

既設歩道橋
撤去工

新設歩道橋
下部工②

施工予定時期 R5年3月中旬～5月中旬

交通島撤去

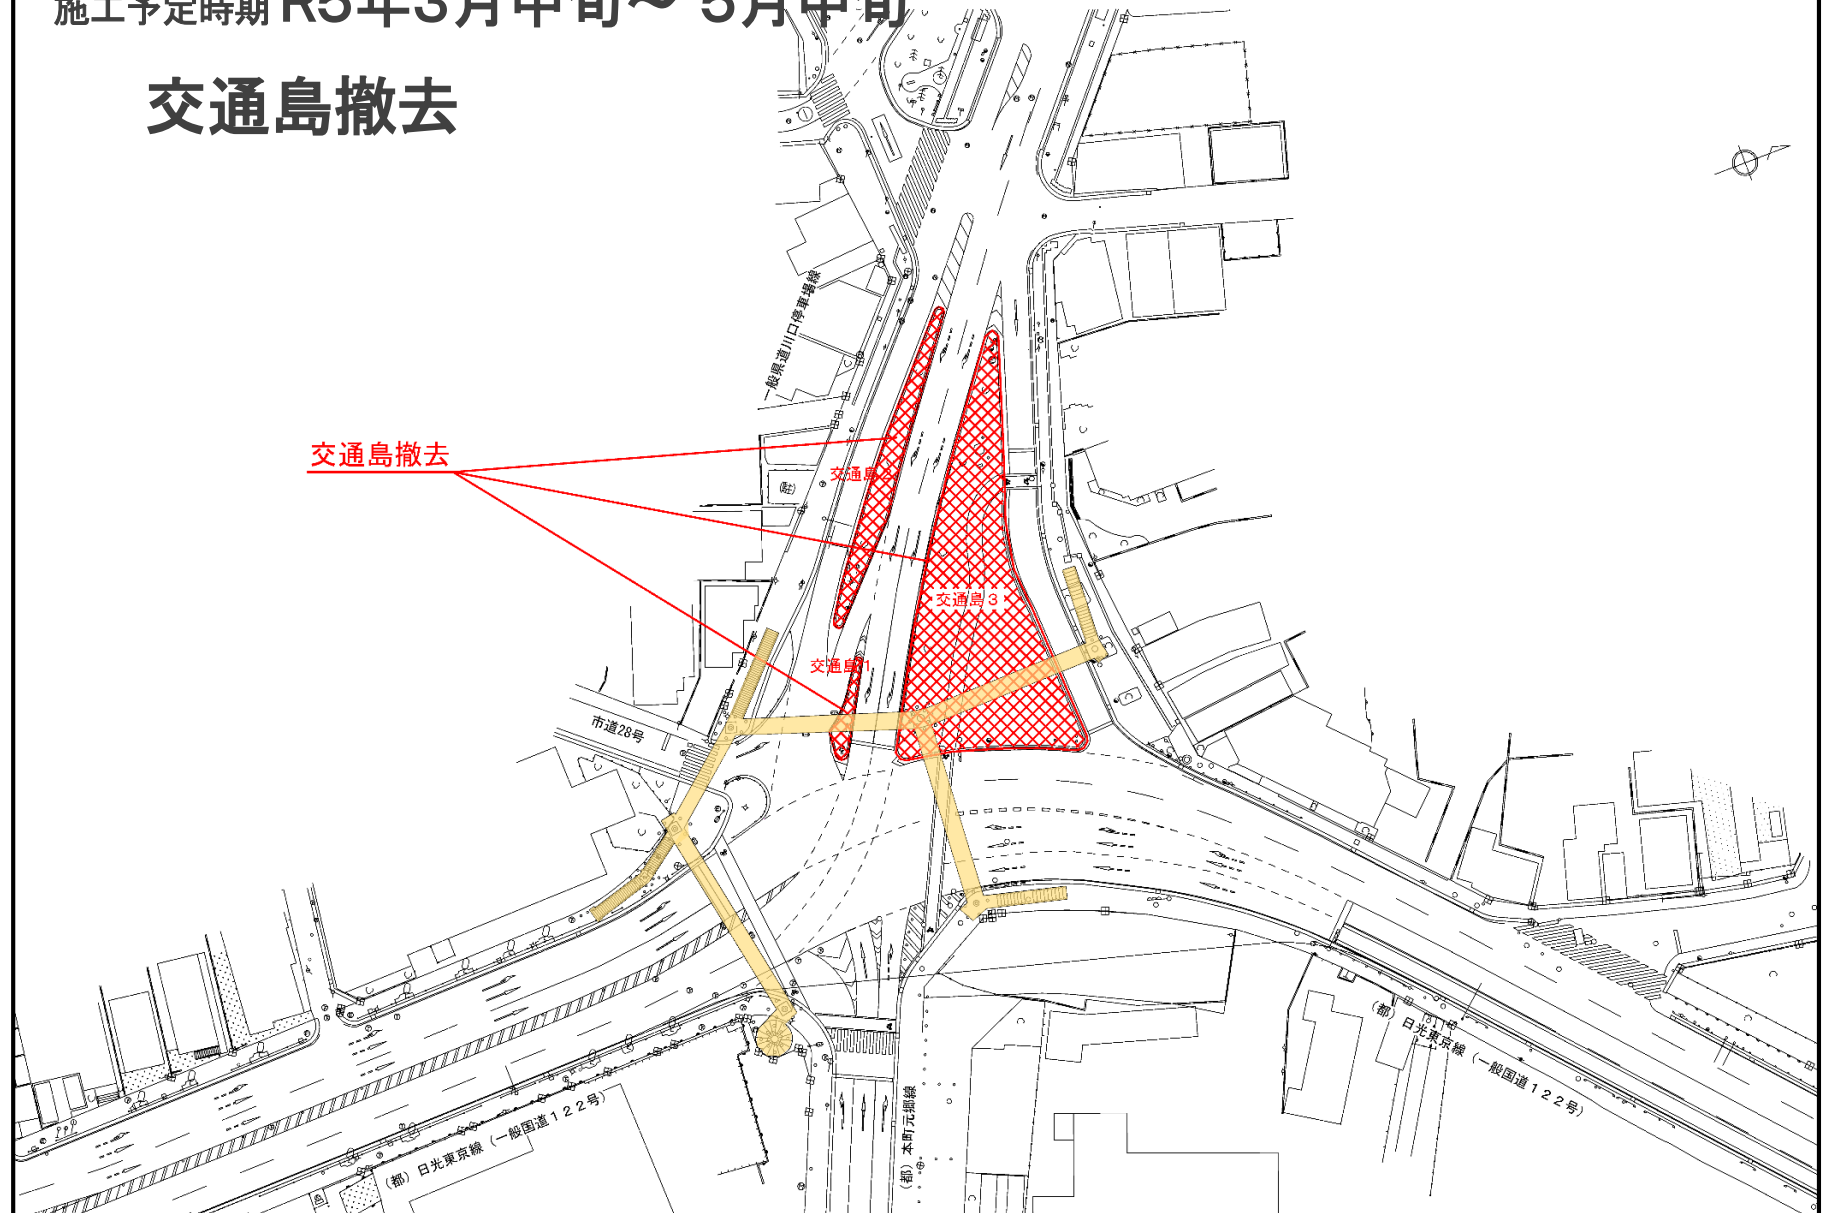

工事内容

交通島撤去工 等



新設歩道橋
下部工①

既設歩道橋
撤去工

新設歩道橋
下部工②

施工予定時期 R5年6月上旬 ~ 9月下旬

基礎杭施工①

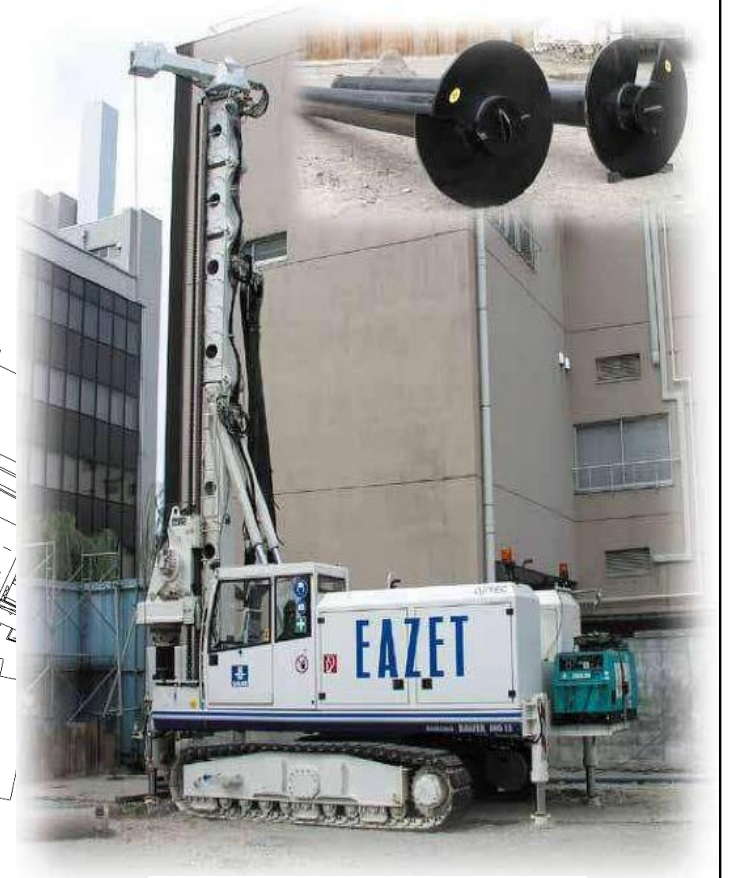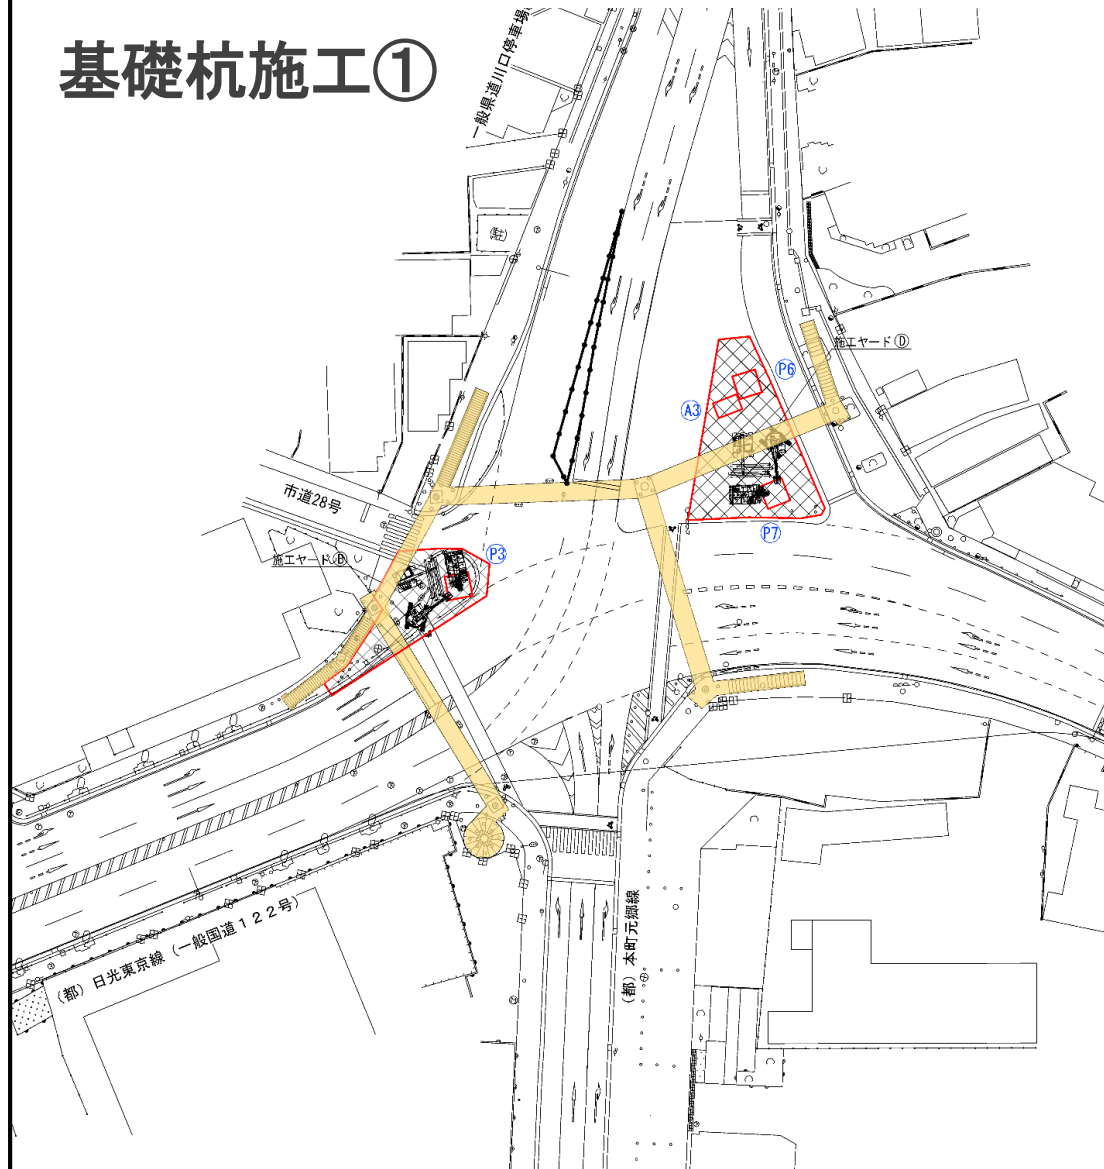

基礎杭施工写真

工事内容


交通島撤去工 等

新設歩道橋
下部工①

既設歩道橋
撤去工

新設歩道橋
下部工②

歩道橋利用停止時
R6年1月～R7年3月(予定)

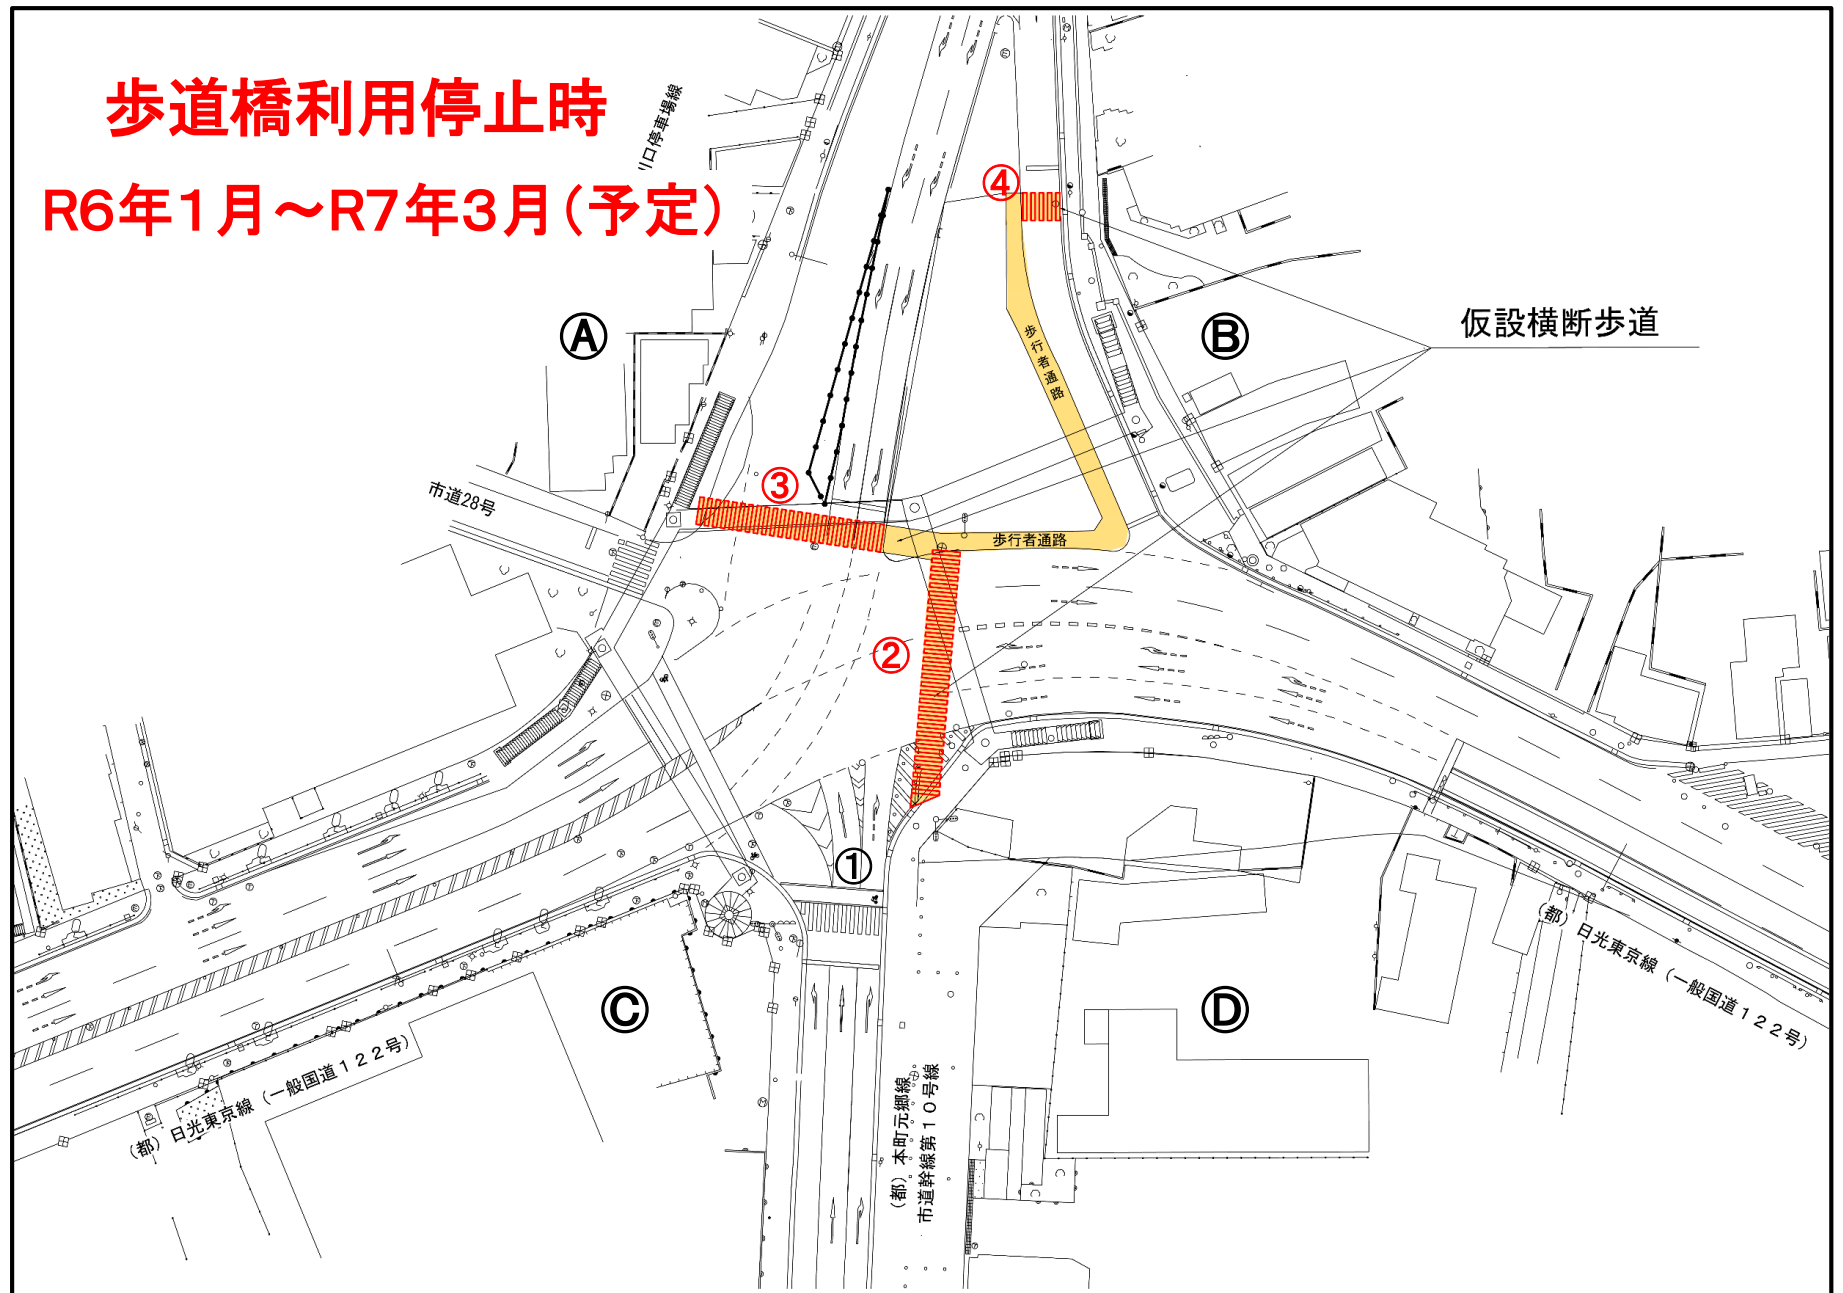

工事内容

交通島撤去工 等

新設歩道橋
下部工①


既設歩道橋
撤去工

新設歩道橋
下部工②

施工予定時期 R6年1月上旬 ~ 4月上旬

【夜間施工】

歩道橋撤去

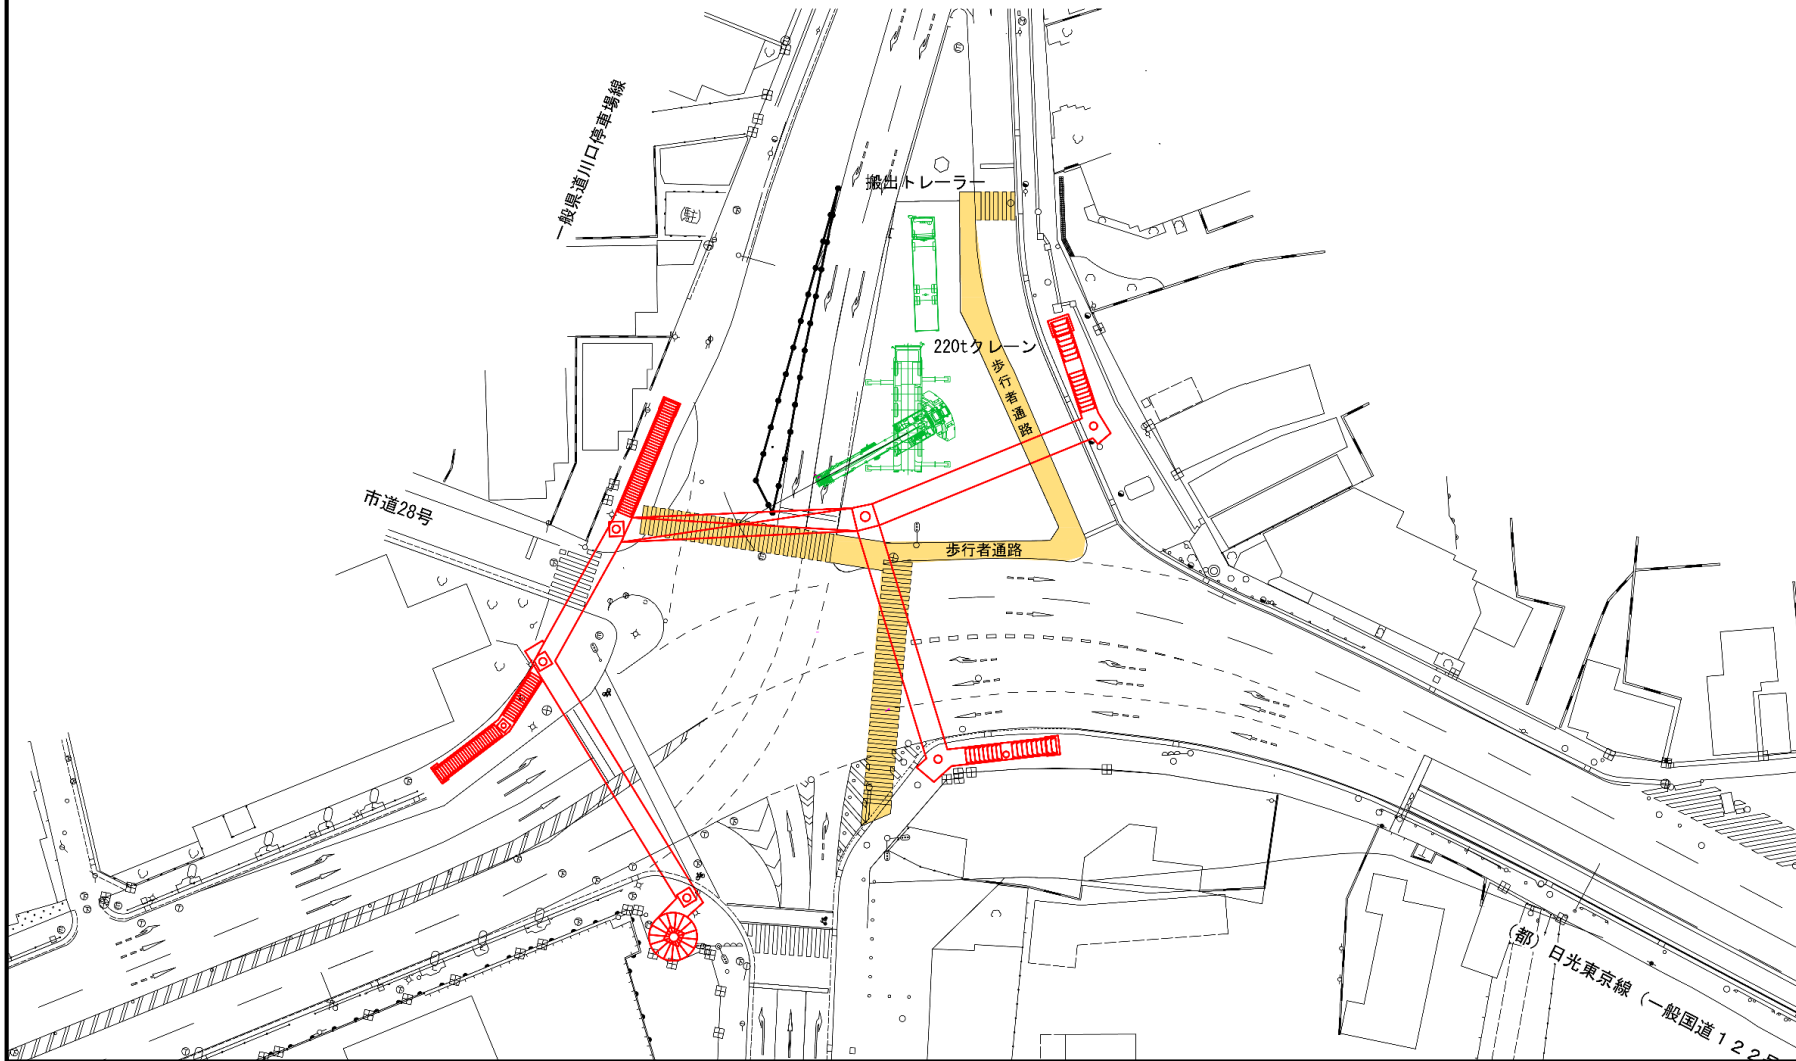

工事内容

交通島撤去工 等



新設歩道橋
下部工①

既設歩道橋
撤去工

新設歩道橋
下部工②

施工予定時期 R6年5月中旬 ~ 8月上旬

基礎杭施工②

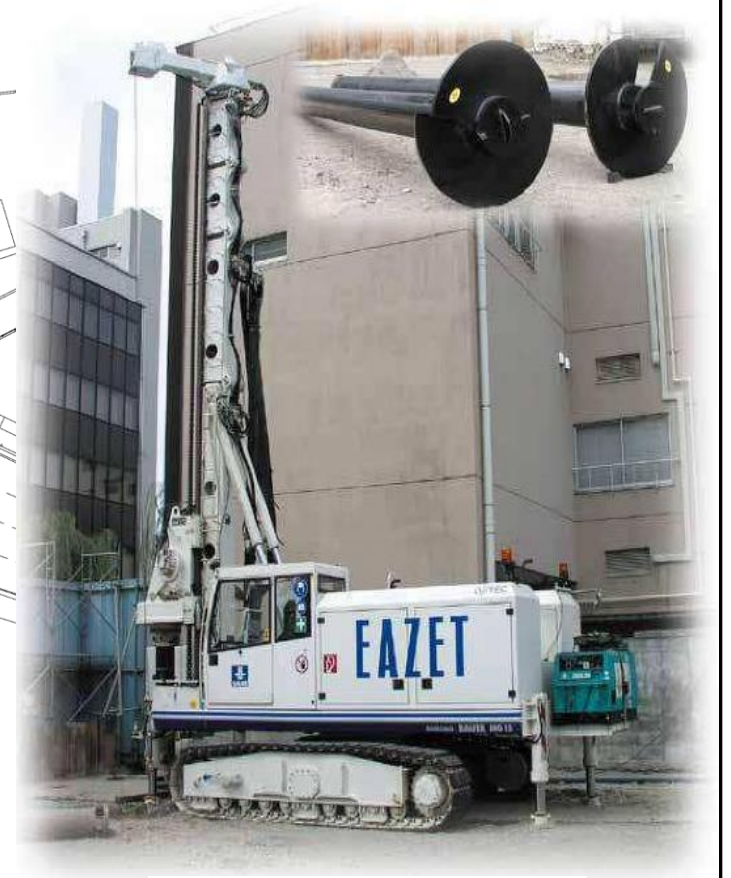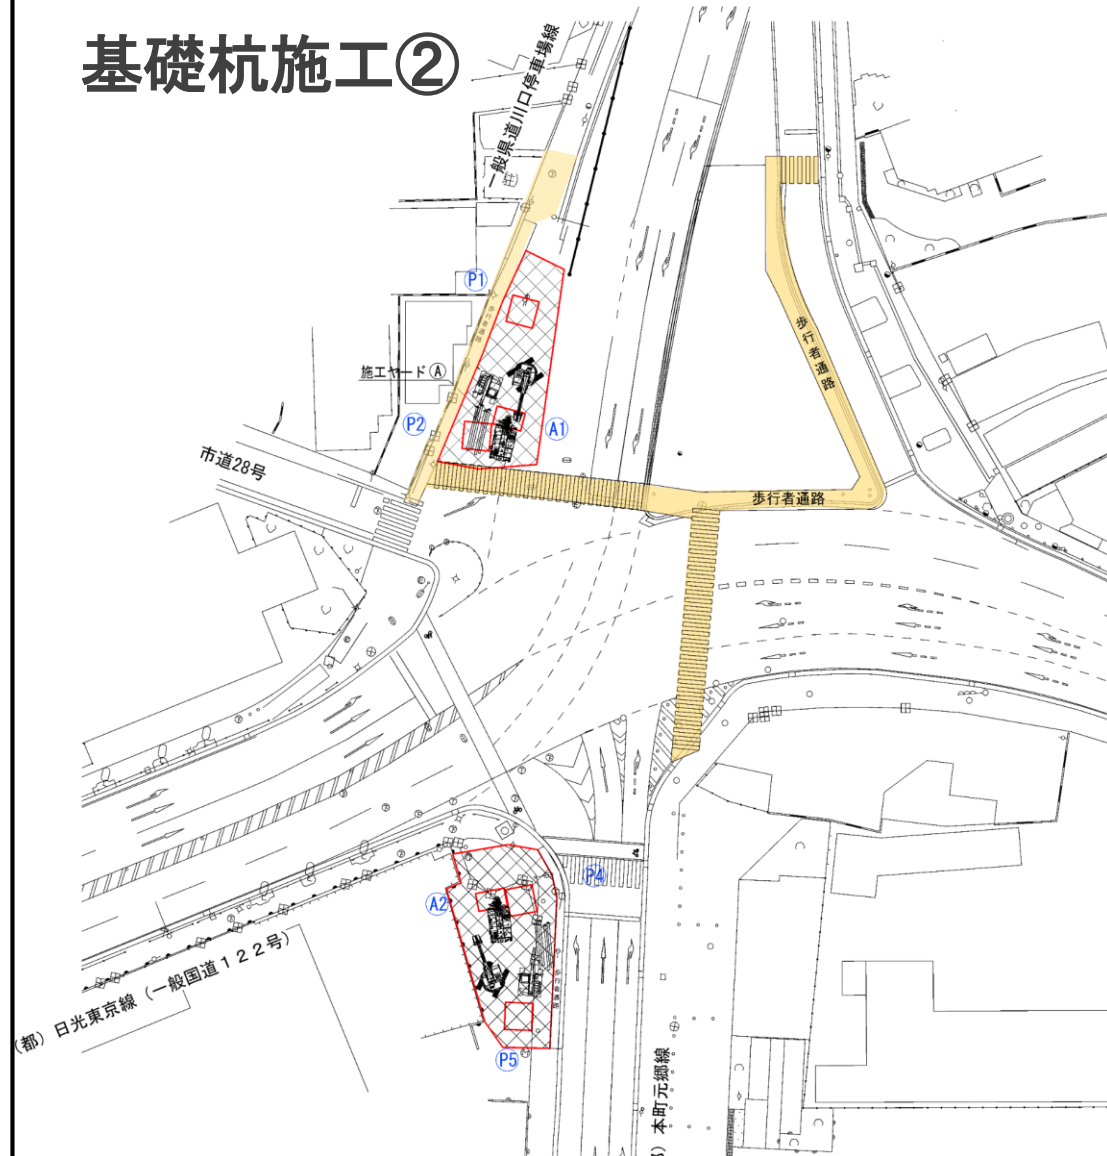

基礎杭施工写真

工事内容

交通島撤去工 等


新設歩道橋
下部工①

既設歩道橋
撤去工

新設歩道橋
下部工②

下部工
完成

下部工完成 R6年8月下旬(予定)

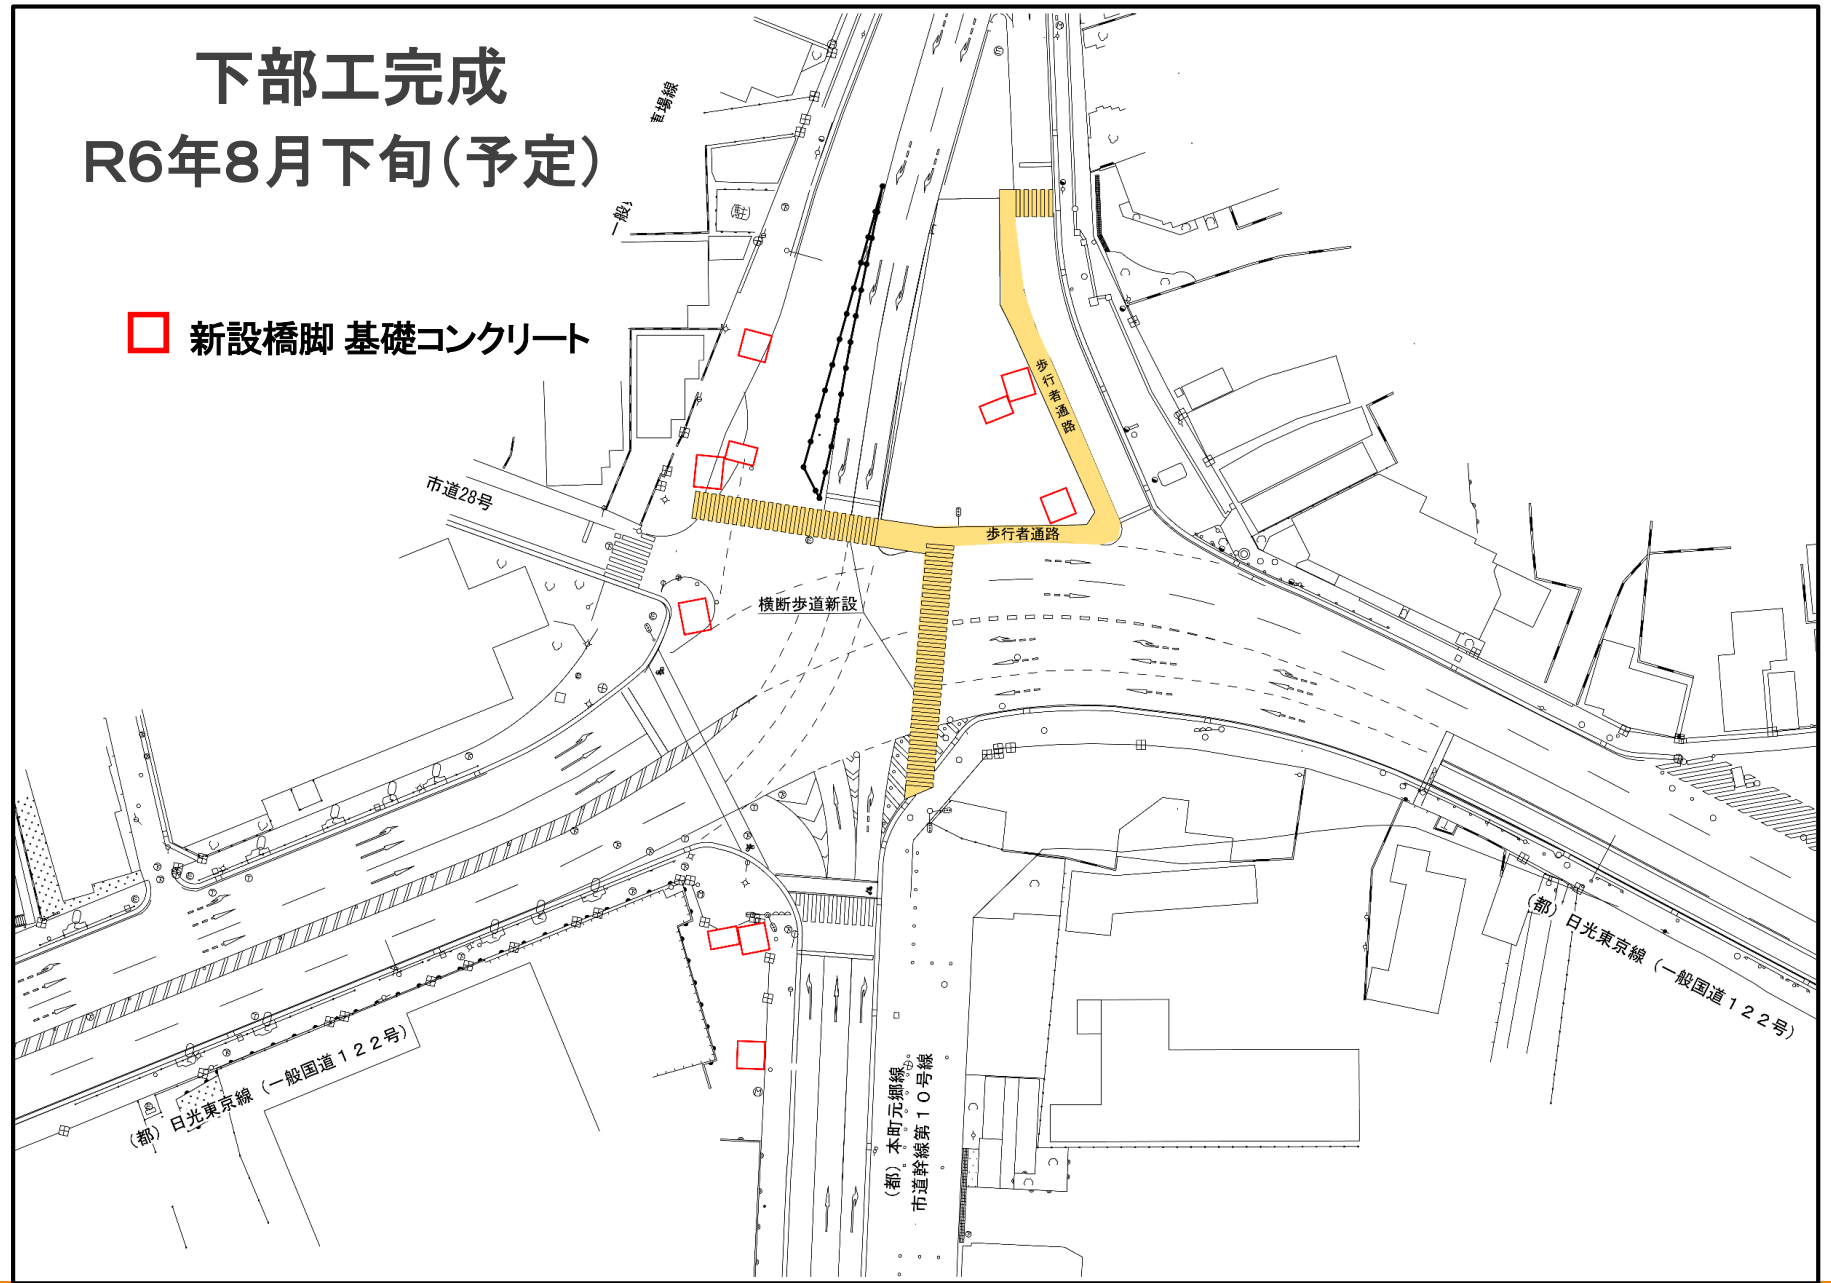

工程表

計 画 工 程 表																																																							
工事名： 総A除) 街路改良工事(歩道橋下部工)																施工者： 中原建設株式会社																																							
		R5.3			R5.4			R5.5			R5.6			R5.7			R5.8			R5.9			R5.10			R5.11			R5.12			R6.1			R6.2			R6.3			R6.4			R6.5			R6.6			R6.7			R6.8		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30			
準備工		<div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 5px;"></div> 工事説明会																																																					
付帯工	交通島撤去工 工事用道路設置工 信号機移設工 等	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div> 交通島撤去、工事用道路設置等						<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div> 信号機移設工 等						<div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 5px;"></div> 舗装復旧																																									
新設歩道橋 下部工	基礎杭工 橋脚フーチング工	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div> 基礎杭工① 橋脚フーチング工						<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div> 基礎杭工② 橋脚フーチング工																																															
既設歩道橋 撤去工	既設橋撤去工 基礎撤去工	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div> 既設歩道橋撤去												<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div> 基礎コンクリート撤去																																									
歩道橋	利用不可期間													<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div> R6.1月上旬 歩道橋利用停止 ~R7.3月																																									

交通規制等

【施工時間】

原則、昼間施工 9 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0

既設歩道橋の桁撤去は、夜間施工 2 1 : 0 0 ~ 5 : 0 0

【交通規制】

原則、現状の交通を確保しますが、
工事で必要なときに、次のとおり交通規制をかけます。

歩行者 : 迂回路を設置

車 両 : 国道 1 2 2 号 一車線規制(夜間)

川口停車場線 幅員減少(昼間)、一車線規制(夜間)

市道 2 8 号線 片側交互通行(昼間)

★詳細を検討中のため、決まり次第、HP等で掲示します。

今後の工事状況について

【工事状況等のお知らせ方法】

①埼玉県さいたま県土整備事務所のホームページ

(<https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b1001/index.html>)

- ・本日の資料
- ・今後の工事スケジュール(随時更新)

②自治会回覧

- ・地元の方に大きく関わる事項のお知らせ

【問合せ先】

- ・さいたま県土整備事務所 道路施設担当 岩井、岡野

(電話 048-861-2493)

- ・中原建設株式会社 現場代理人 加藤 勇

(電話 048-269-3310(会社) 070-2170-9408(加藤携帯))
