

かすかべ連立ニュース

第14号 令和8年2月発行



工事情報
埼玉県鉄道高架
建設事務所HP



工事説明動画
工事概要について
(YouTube)



事業リーフレットへのリンク
(埼玉県HP内)

発行者
埼玉県鉄道高架建設事務所
春日部市鉄道高架株式会社

令和7年10月5日(日)より伊勢崎仮下り線・仮下りホームの供用を開始しました。
引き続き、鉄道高架化のスペースを確保するため、野田仮上下線の工事等を進めていきます。

用地確保の進捗率 96.8%
(令和8年1月末時点)

現在の工事等進捗状況

①伊勢崎旧下り線 撤去工事



軌道撤去状況




搬入路整備状況


②野田仮上下線 新設工事



軌道新設状況

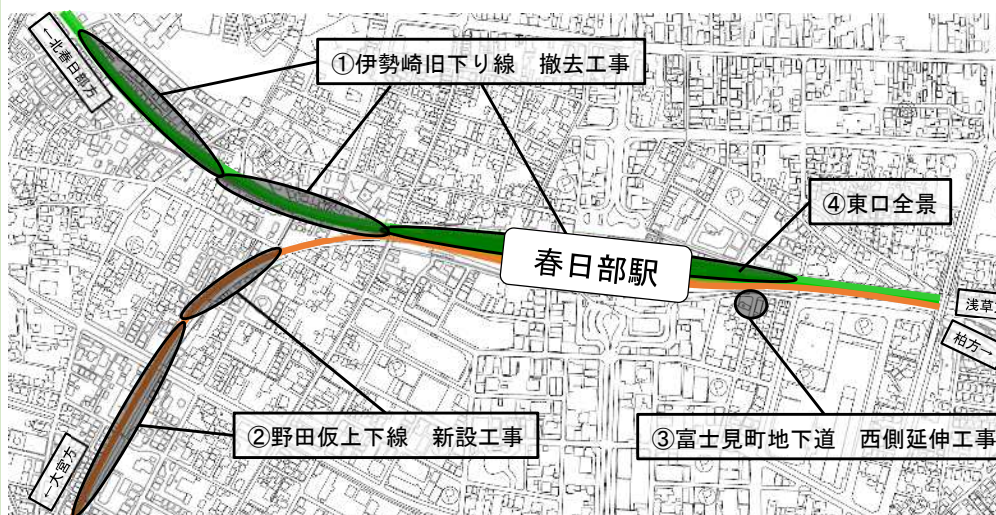

伊勢崎仮上下線施工範囲
(切替え済み)
野田仮上下線施工範囲

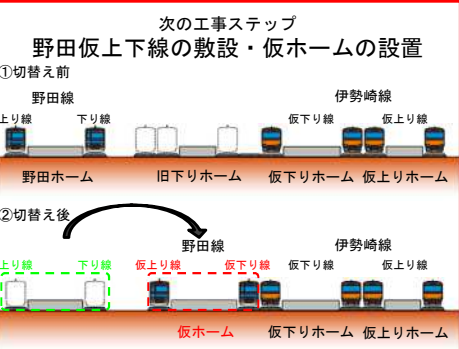

③富士見町地下道 西側延伸工事



土留め工施工状況



敷鉄板設置状況



春日部駅構内工事施工状況

④東口全景

①伊勢崎旧下り線 撤去工事

野田仮上下線敷設及び高架橋工事に向け、使われなくなった伊勢崎旧下り線の撤去工事を行っています。
今後、春日部駅では伊勢崎線旧下りホームの改修を行い、野田仮ホームとして使うための工事を進めていきます。

②野田仮上下線 新設工事

八木崎～春日部駅間については、路盤工事が終了した範囲から、順次、野田仮上下線の軌道新設工事を行っています。

③富士見町地下道 西側延伸工事

富士見町地下道の西側出入口は、今後予定されている高架橋工事に支障となることから、地下道の延伸工事を行っています。土留め工及び敷鉄板設置が終了し、今後は地盤改良工事を進めていきます。また、工事の進捗に合わせ、同地下道前面道路が終日、車両通行止めとなります。(歩行者は通行可能です。)
